


プレキャストU字側溝・ 自由勾配側溝工 出来形成果表

工事番号 _____ 工事名 国道 × 舗装修繕工事 _____ 現場代理人 日本 太郎 _____ 施工管理担当者 _____

(単位 mm)

測定箇所 規格値	K 1			W 1			T 1			W 2			T 2			測定年月日	備考
	±30			-50			-30			-50			-30				
測点	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差		
No.0	95.250	95.250	±0	1.000	1.000	±0	200	200	±0	800	799	-1	100	99	-1		
BC1	96.530	96.526	-4	1.000	998	-2	200	204	+4	800	796	-4	100	103	+3		
No.1	96.570	96.572	+2	1.000	1.001	+1	200	202	+2	800	799	-1	100	102	+2		
No.1+5.500	97.290	97.290	±0	1.000	1.003	+3	200	200	±0	800	804	+4	100	99	-1		
SP1	97.390	97.385	-5	1.000	1.003	+3	200	205	+5	800	805	+5	100	100	±0		
No.2	97.680	97.679	-1	1.000	1.000	±0	200	201	+1	800	798	-2	100	103	+3		
EC1	97.700	97.702	+2	1.000	1.000	±0	200	203	+3	800	804	+4	100	100	±0		
KA2-1	97.625	97.628	+3	1.000	998	-2	200	199	-1	800	796	-4	100	103	+3		
No.2+6.800	99.985	99.987	+2	1.000	998	-2	200	200	±0	800	799	-1	100	97	-3		
No.3	97.916	97.920	+4	1.000	1.004	+4	200	201	+1	800	803	+3	100	103	+3		

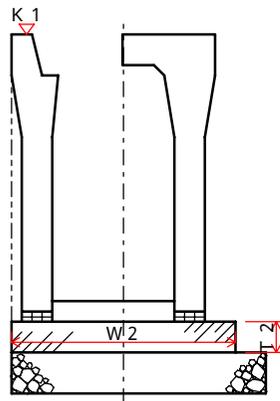

判定


プレキャストU字側溝・ 自由勾配側溝工 出来形成果表

総括監督員	主任監督員

工事番号
工事名 国道 × 舗装修繕工事
現場代理人 日本 太郎
施工管理担当者

(単位 mm)

測定箇所 規格値	K 1			W 1			T 1			W 2			T 2			測定年月日	備考
	±30			-50			-30			-50			-30				
測点	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差		
No.0	95.250	95.250	±0	1.000	1.000	±0	200	200	±0	800	799	-1	100	99	-1		
BC1	96.530	96.526	-4	1.000	998	-2	200	204	+4	800	796	-4	100	103	+3		
No.1	96.570	96.572	+2	1.000	1.001	+1	200	202	+2	800	799	-1	100	102	+2		
No.1+5.500	97.290	97.290	±0	1.000	1.003	+3	200	200	±0	800	804	+4	100	99	-1		
SP1	97.390	97.385	-5	1.000	1.003	+3	200	205	+5	800	805	+5	100	100	±0		
No.2	97.680	97.679	-1	1.000	1.000	±0	200	201	+1	800	798	-2	100	103	+3		
EC1	97.700	97.702	+2	1.000	1.000	±0	200	203	+3	800	804	+4	100	100	±0		
KA2-1	97.625	97.628	+3	1.000	998	-2	200	199	-1	800	796	-4	100	103	+3		
No.2+6.800	99.985	99.987	+2	1.000	998	-2	200	200	±0	800	799	-1	100	97	-3		
No.3	97.916	97.920	+4	1.000	1.004	+4	200	201	+1	800	803	+3	100	103	+3		

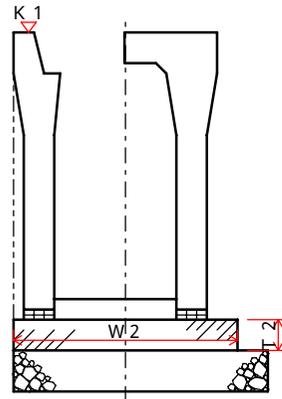

判定


プレキャストU字側溝・ 自由勾配側溝工 出来形成果表

総括監督員	主任監督員

工事番号 _____ 工事名 国道 × 舗装修繕工事 _____ 現場代理人 日本 太郎 _____ 印 施工管理担当者 _____ 印

(単位 mm)

測定箇所 規格値	K 1			W 1			T 1			W 2			T 2			測定年月日	備考
	±30			-50			-30			-50			-30				
測点	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差		
No.0	95.250	95.250	±0	1.000	1.000	±0	200	200	±0	800	799	-1	100	99	-1		
BC1	96.530	96.526	-4	1.000	998	-2	200	204	+4	800	796	-4	100	103	+3		
No.1	96.570	96.572	+2	1.000	1.001	+1	200	202	+2	800	799	-1	100	102	+2		
No.1+5.500	97.290	97.290	±0	1.000	1.003	+3	200	200	±0	800	804	+4	100	99	-1		
SP1	97.390	97.385	-5	1.000	1.003	+3	200	205	+5	800	805	+5	100	100	±0		
No.2	97.680	97.679	-1	1.000	1.000	±0	200	201	+1	800	798	-2	100	103	+3		
EC1	97.700	97.702	+2	1.000	1.000	±0	200	203	+3	800	804	+4	100	100	±0		
KA2-1	97.625	97.628	+3	1.000	998	-2	200	199	-1	800	796	-4	100	103	+3		
No.2+6.800	99.985	99.987	+2	1.000	998	-2	200	200	±0	800	799	-1	100	97	-3		
No.3	97.916	97.920	+4	1.000	1.004	+4	200	201	+1	800	803	+3	100	103	+3		

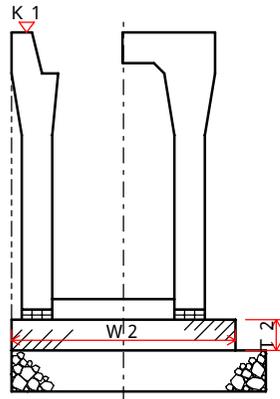

判定

出来形成果表

工事番号： _____


工事名： 国道 × 舗装修繕工事 _____

現場代理人 日本 太郎



工種： 水路工

種別： プレキャストU字側溝・自由勾配側溝工

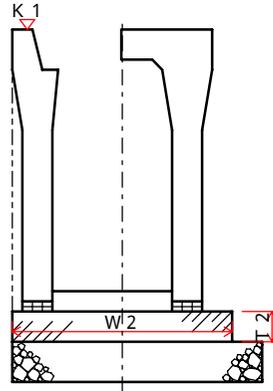

単位は mm。

() は規格値。

測 点	K 1			W 1			T 1			W 2			T 2					
	(±30)			(-50)			(-30)			(-50)			(-30)			()		
	設 計	実 測	誤 差	設 計	実 測	誤 差	設 計	実 測	誤 差	設 計	実 測	誤 差	設 計	実 測	誤 差	設 計	実 測	誤 差
No.0	95.250	95.250	±0	1,000	1,000	±0	200	200	±0	800	799	-1	100	99	-1			
BC1	96.530	96.526	-4	1,000	998	-2	200	204	+4	800	796	-4	100	103	+3			
No.1	96.570	96.572	+2	1,000	1,001	+1	200	202	+2	800	799	-1	100	102	+2			
No.1+5.500	97.290	97.290	±0	1,000	1,003	+3	200	200	±0	800	804	+4	100	99	-1			
SP1	97.390	97.385	-5	1,000	1,003	+3	200	205	+5	800	805	+5	100	100	±0			
No.2	97.680	97.679	-1	1,000	1,000	±0	200	201	+1	800	798	-2	100	103	+3			
EC1	97.700	97.702	+2	1,000	1,000	±0	200	203	+3	800	804	+4	100	100	±0			
KA2-1	97.625	97.628	+3	1,000	998	-2	200	199	-1	800	796	-4	100	103	+3			
No.2+6.800	99.985	99.987	+2	1,000	998	-2	200	200	±0	800	799	-1	100	97	-3			
No.3	97.916	97.920	+4	1,000	1,004	+4	200	201	+1	800	803	+3	100	103	+3			
KA2-2	103.200	103.198	-2	1,000	1,002	+2	200	198	-2	800	796	-4	100	101	+1			
No.4	103.480	103.480	±0	1,000	1,002	+2	200	203	+3	800	801	+1	100	101	+1			
KA3-1	103.580	103.583	+3	1,000	1,001	+1	200	202	+2	800	801	+1	100	101	+1			
KE3	106.060	106.059	-1	1,000	1,000	±0	200	202	+2	800	801	+1	100	101	+1			
No.5	107.973	107.973	±0	1,000	1,000	±0	200	199	-1	800	803	+3	100	101	+1			
KA3-2	111.118	111.119	+1	1,000	1,003	+3	200	203	+3	800	802	+2	100	96	-4			


出来形成果表

国道 × 舗装修繕工事

水路工

種 目 プレキャストU字側溝・自由勾配側溝工

記 事

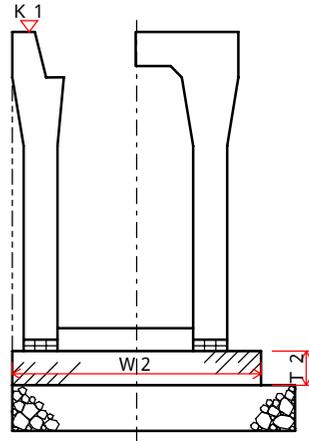

主任監督員	監督員	監督員

請 負 人 ウェストフィールド株式会社

現場代理人 日本 太郎 印

測 定 者 印

測 点	K 1 (± 30)			W 1 (-50)			T 1 (-30)			W 2 (-50)			T 2 (-30)			()			()		
	設 計	出来形	誤 差	設 計	出来形	誤 差	設 計	出来形	誤 差	設 計	出来形	誤 差	設 計	出来形	誤 差	設 計	出来形	誤 差	設 計	出来形	誤 差
No.0	95.250	95.250	±0	1,000	1,000	±0	200	200	±0	800	799	-1	100	99	-1						
BC1	96.530	96.526	-4	1,000	998	-2	200	204	+4	800	796	-4	100	103	+3						
No.1	96.570	96.572	+2	1,000	1,001	+1	200	202	+2	800	799	-1	100	102	+2						
No.1+5.500	97.290	97.290	±0	1,000	1,003	+3	200	200	±0	800	804	+4	100	99	-1						
SP1	97.390	97.385	-5	1,000	1,003	+3	200	205	+5	800	805	+5	100	100	±0						
No.2	97.680	97.679	-1	1,000	1,000	±0	200	201	+1	800	798	-2	100	103	+3						
EC1	97.700	97.702	+2	1,000	1,000	±0	200	203	+3	800	804	+4	100	100	±0						
KA2-1	97.625	97.628	+3	1,000	998	-2	200	199	-1	800	796	-4	100	103	+3						

総括監督員	主任監督員

水路工 出来形成果表

工事番号 _____


工事名 国道 × 舗装修繕工事

現場代理人 日本 太郎

施工管理担当者 _____

(単位 mm)

測定箇所 規格値	K 1			W 1			T 1			W 2			T 2						測定年月日	備考		
	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差				
No.0	95.250	95.250	±0	1,000	1,000	±0	200	200	±0	800	799	-1	100	99	-1							
BC1	96.530	96.526	-4	1,000	998	-2	200	204	+4	800	796	-4	100	103	+3							
No.1	96.570	96.572	+2	1,000	1,001	+1	200	202	+2	800	799	-1	100	102	+2							
No.1+5.500	97.290	97.290	±0	1,000	1,003	+3	200	200	±0	800	804	+4	100	99	-1							
SP1	97.390	97.385	-5	1,000	1,003	+3	200	205	+5	800	805	+5	100	100	±0							
No.2	97.680	97.679	-1	1,000	1,000	±0	200	201	+1	800	798	-2	100	103	+3							
EC1	97.700	97.702	+2	1,000	1,000	±0	200	203	+3	800	804	+4	100	100	±0							
KA2-1	97.625	97.628	+3	1,000	998	-2	200	199	-1	800	796	-4	100	103	+3							
No.2+6.800	99.985	99.987	+2	1,000	998	-2	200	200	±0	800	799	-1	100	97	-3							
No.3	97.916	97.920	+4	1,000	1,004	+4	200	201	+1	800	803	+3	100	103	+3							
測定箇所 規格値																			測定年月日	備考		
測 点	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差			設計値	実測値
No.0																						
BC1																						
No.1																						
No.1+5.500																						
SP1																						
No.2																						
EC1																						
KA2-1																						
No.2+6.800																						
No.3																						



判 定

工事番号


工事名 国道 × 舗装修繕工事

水路工

出来高成果表

種目 プレキャストU字側溝・自由勾配側溝工

路線名

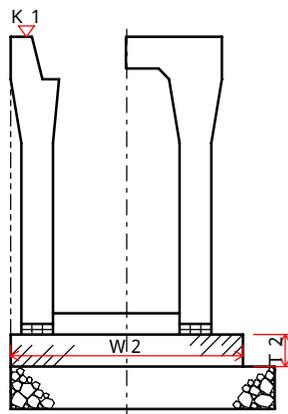

監督	現場代理人	主任技術者

請負者：ウェストフィールド株式会社

現場代理人：日本 太郎

測定者：

測定日：

人孔番号	K 1			W 1			T 1			W 2					T 2					摘要
	±30			-50			-30			-50					-30					
	出来高	設計値	誤差	出来高	設計値	誤差	出来高	設計値	誤差	出来高	設計値	誤差	B	W	出来高	設計値	誤差	出来高勾配	設計勾配	
No.0	95.250	95.250	±0	1,000	1,000	±0	200	200	±0	799	800	-1			99	100	-1			
BC1	96.526	96.530	-4	998	1,000	-2	204	200	+4	796	800	-4			103	100	+3			
No.1	96.572	96.570	+2	1,001	1,000	+1	202	200	+2	799	800	-1			102	100	+2			
No.1+5.500	97.290	97.290	±0	1,003	1,000	+3	200	200	±0	804	800	+4			99	100	-1			
SP1	97.385	97.390	-5	1,003	1,000	+3	205	200	+5	805	800	+5			100	100	±0			
No.2	97.679	97.680	-1	1,000	1,000	±0	201	200	+1	798	800	-2			103	100	+3			
EC1	97.702	97.700	+2	1,000	1,000	±0	203	200	+3	804	800	+4			100	100	±0			
KA2-1	97.628	97.625	+3	998	1,000	-2	199	200	-1	796	800	-4			103	100	+3			
No.2+6.800	99.987	99.985	+2	998	1,000	-2	200	200	±0	799	800	-1			97	100	-3			
No.3	97.920	97.916	+4	1,004	1,000	+4	201	200	+1	803	800	+3			103	100	+3			
KA2-2	103.198	103.200	-2	1,002	1,000	+2	198	200	-2	796	800	-4			101	100	+1			
No.4	103.480	103.480	±0	1,002	1,000	+2	203	200	+3	801	800	+1			101	100	+1			
KA3-1	103.583	103.580	+3	1,001	1,000	+1	202	200	+2	801	800	+1			101	100	+1			
KE3	106.059	106.060	-1	1,000	1,000	±0	202	200	+2	801	800	+1			101	100	+1			
No.5	107.973	107.973	±0	1,000	1,000	±0	199	200	-1	803	800	+3			101	100	+1			

プレキャストU字側溝・自由 勾配側溝工


出来形管理成果表

課長	係長	監督員	監督員	監督員

工事名 国道 × 舗装修繕工事
 工事箇所

ウェストフィールド株式
 請負人 会社
 測定者 印


工種	水路工
種別	プレキャストU字側溝・自由 勾配側溝工
細別	

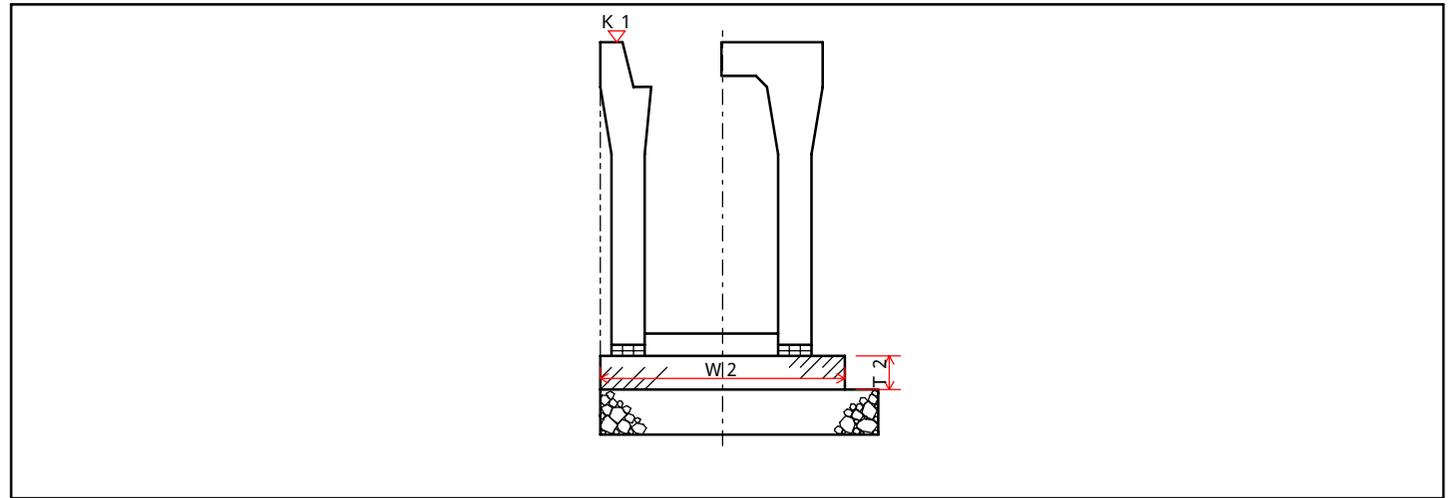

規格値 位置	(± 30)			(-50)			(-30)			(-50)			(-30)			()			()		
	K 1			W 1			T 1			W 2			T 2								
測点	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差	設計値	実測値	差
No.0	95.250	95.250	±0	1,000	1,000	±0	200	200	±0	800	799	-1	100	99	-1						
BC1	96.530	96.526	-4	1,000	998	-2	200	204	+4	800	796	-4	100	103	+3						
No.1	96.570	96.572	+2	1,000	1,001	+1	200	202	+2	800	799	-1	100	102	+2						
No.1+5.50 0	97.290	97.290	±0	1,000	1,003	+3	200	200	±0	800	804	+4	100	99	-1						
SP1	97.390	97.385	-5	1,000	1,003	+3	200	205	+5	800	805	+5	100	100	±0						
No.2	97.680	97.679	-1	1,000	1,000	±0	200	201	+1	800	798	-2	100	103	+3						
EC1	97.700	97.702	+2	1,000	1,000	±0	200	203	+3	800	804	+4	100	100	±0						
KA2-1	97.625	97.628	+3	1,000	998	-2	200	199	-1	800	796	-4	100	103	+3						
No.2+6.80 0	99.985	99.987	+2	1,000	998	-2	200	200	±0	800	799	-1	100	97	-3						

出来形管理表

工事名 : 国道 × 舗装修繕工事

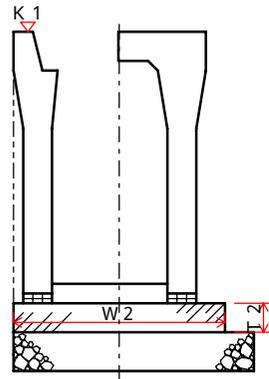

請負者 ウェストフィールド株式会社

現場代理人 日本 太郎

測定者 _____


路線	マホール番号	K 1			W 1			T 1			W 2			T 2			備考
		設計	出来形	誤差	設計	出来形	誤差	設計	出来形	誤差	設計	出来形	誤差	設計	出来形	誤差	
	No.0	95.250	95.250	±0	1,000.000	1,000.000	±0	200.000	200.000	±0	800.000	799.000	-1	100.000	99.000	-1	
	BC1	96.530	96.526	-4	1,000.000	998.000	-2	200.000	204.000	+4	800.000	796.000	-4	100.000	103.000	+3	
	No.1	96.570	96.572	+2	1,000.000	1,001.000	+1	200.000	202.000	+2	800.000	799.000	-1	100.000	102.000	+2	
	No.1+5.500	97.290	97.290	±0	1,000.000	1,003.000	+3	200.000	200.000	±0	800.000	804.000	+4	100.000	99.000	-1	
	SP1	97.390	97.385	-5	1,000.000	1,003.000	+3	200.000	205.000	+5	800.000	805.000	+5	100.000	100.000	±0	
	No.2	97.680	97.679	-1	1,000.000	1,000.000	±0	200.000	201.000	+1	800.000	798.000	-2	100.000	103.000	+3	
	EC1	97.700	97.702	+2	1,000.000	1,000.000	±0	200.000	203.000	+3	800.000	804.000	+4	100.000	100.000	±0	
	KA2-1	97.625	97.628	+3	1,000.000	998.000	-2	200.000	199.000	-1	800.000	796.000	-4	100.000	103.000	+3	
	No.2+6.800	99.985	99.987	+2	1,000.000	998.000	-2	200.000	200.000	±0	800.000	799.000	-1	100.000	97.000	-3	
	No.3	97.916	97.920	+4	1,000.000	1,004.000	+4	200.000	201.000	+1	800.000	803.000	+3	100.000	103.000	+3	
	KA2-2	103.200	103.198	-2	1,000.000	1,002.000	+2	200.000	198.000	-2	800.000	796.000	-4	100.000	101.000	+1	
	No.4	103.480	103.480	±0	1,000.000	1,002.000	+2	200.000	203.000	+3	800.000	801.000	+1	100.000	101.000	+1	
	KA3-1	103.580	103.583	+3	1,000.000	1,001.000	+1	200.000	202.000	+2	800.000	801.000	+1	100.000	101.000	+1	
	KE3	106.060	106.059	-1	1,000.000	1,000.000	±0	200.000	202.000	+2	800.000	801.000	+1	100.000	101.000	+1	
	No.5	107.973	107.973	±0	1,000.000	1,000.000	±0	200.000	199.000	-1	800.000	803.000	+3	100.000	101.000	+1	
	KA3-2	111.118	111.119	+1	1,000.000	1,003.000	+3	200.000	203.000	+3	800.000	802.000	+2	100.000	96.000	-4	
	EP	112.363	112.370	+7	1,000.000	1,000.000	±0	200.000	201.000	+1	800.000	803.000	+3	100.000	102.000	+2	

国道 × 舗装修繕工事 プレキャストU字側溝・自由勾配側溝工 管理図表 (T 1)

現場代理人 日本 太郎 印

発注者 _____

測定者 _____ 印

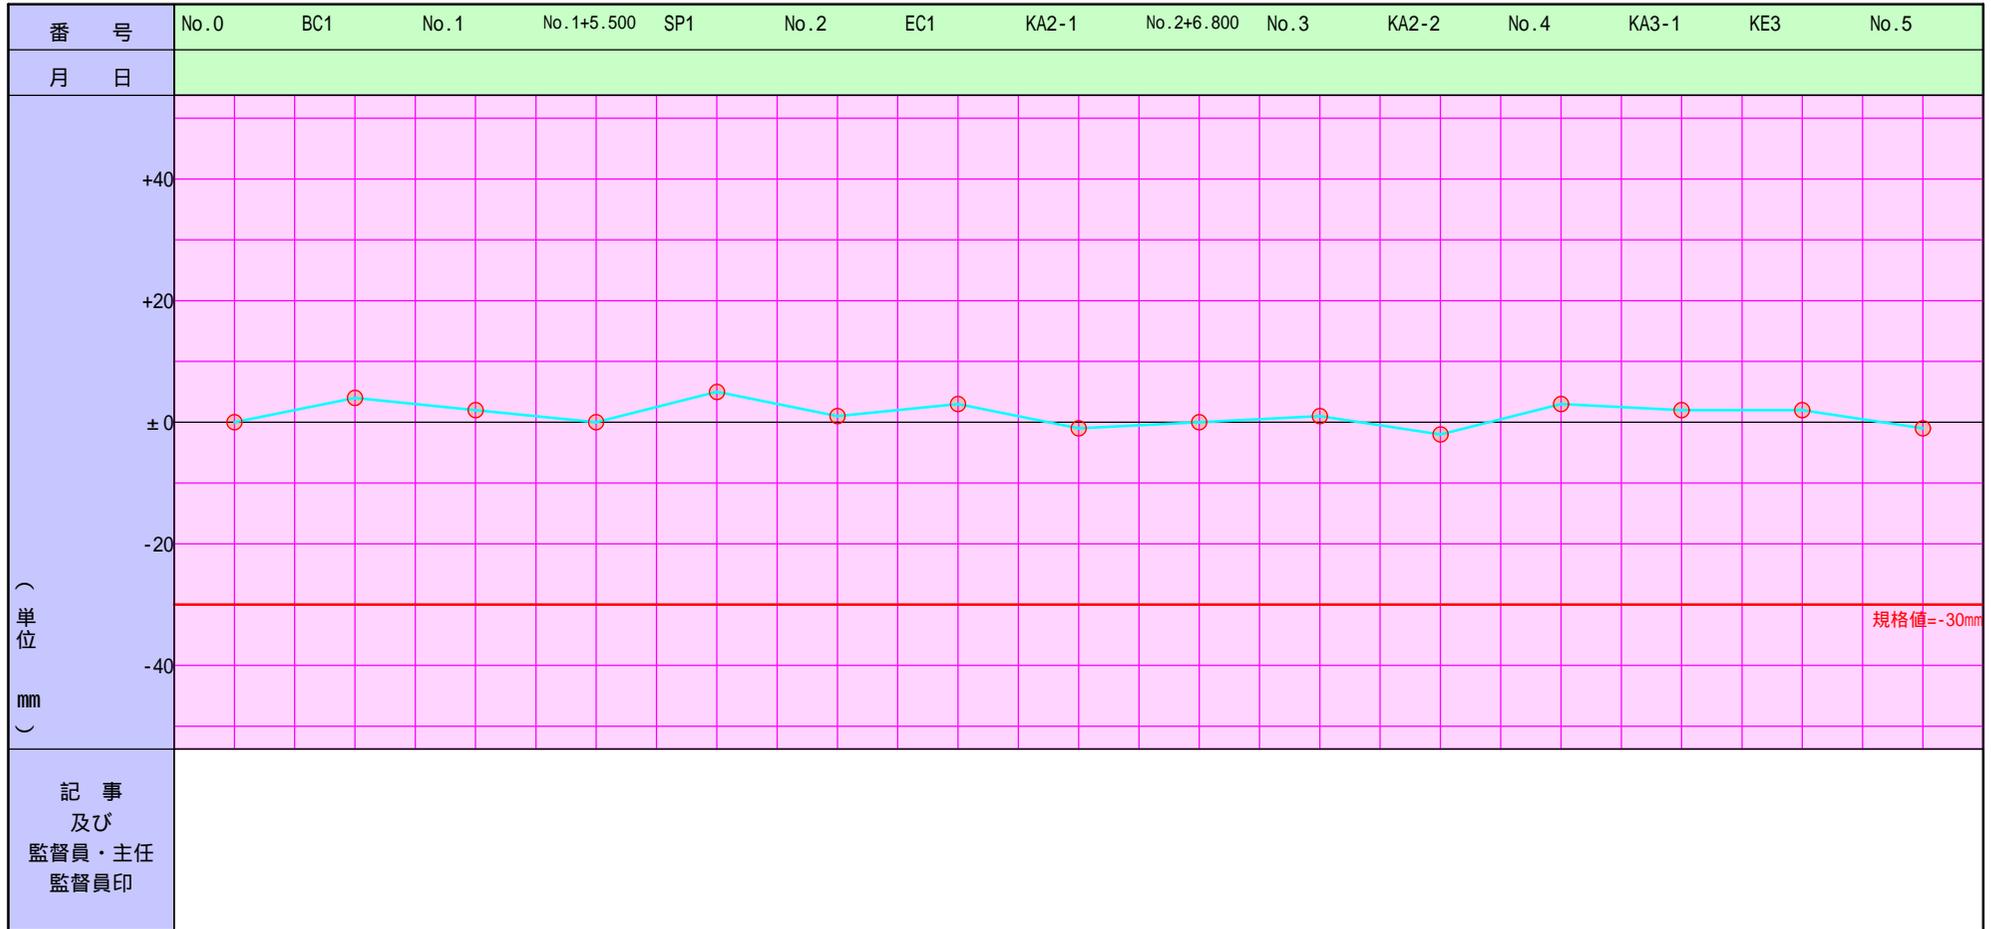

- 注 . 1 . 工種名は土工、路盤工、側コウ工、ノリ履工、ノリ留工等と記入する。
- 2 . 概題は、厚管理図表、基準高管理図表、3 m平たん性管理図表等と記入する。
- 3 . 番号はあらかじめ測点を定め、起点から終点に向かって順序に記入しておく。
- 4 . 月日は、測定の際、該当測量番号にあたるものを記入する。

- 5 . 設計値と実測値の単位を定め、目盛りに数値を記入する。
- 6 . 図表には規格値の線を朱書で記入する。
- 7 . 記事は、手直しの処置等を記入承諾印を押す。


出来形管理図 (工程能力図)

工 種 水路工

種 別 プレキャストU字側溝・自由勾配側溝工

測定者

印

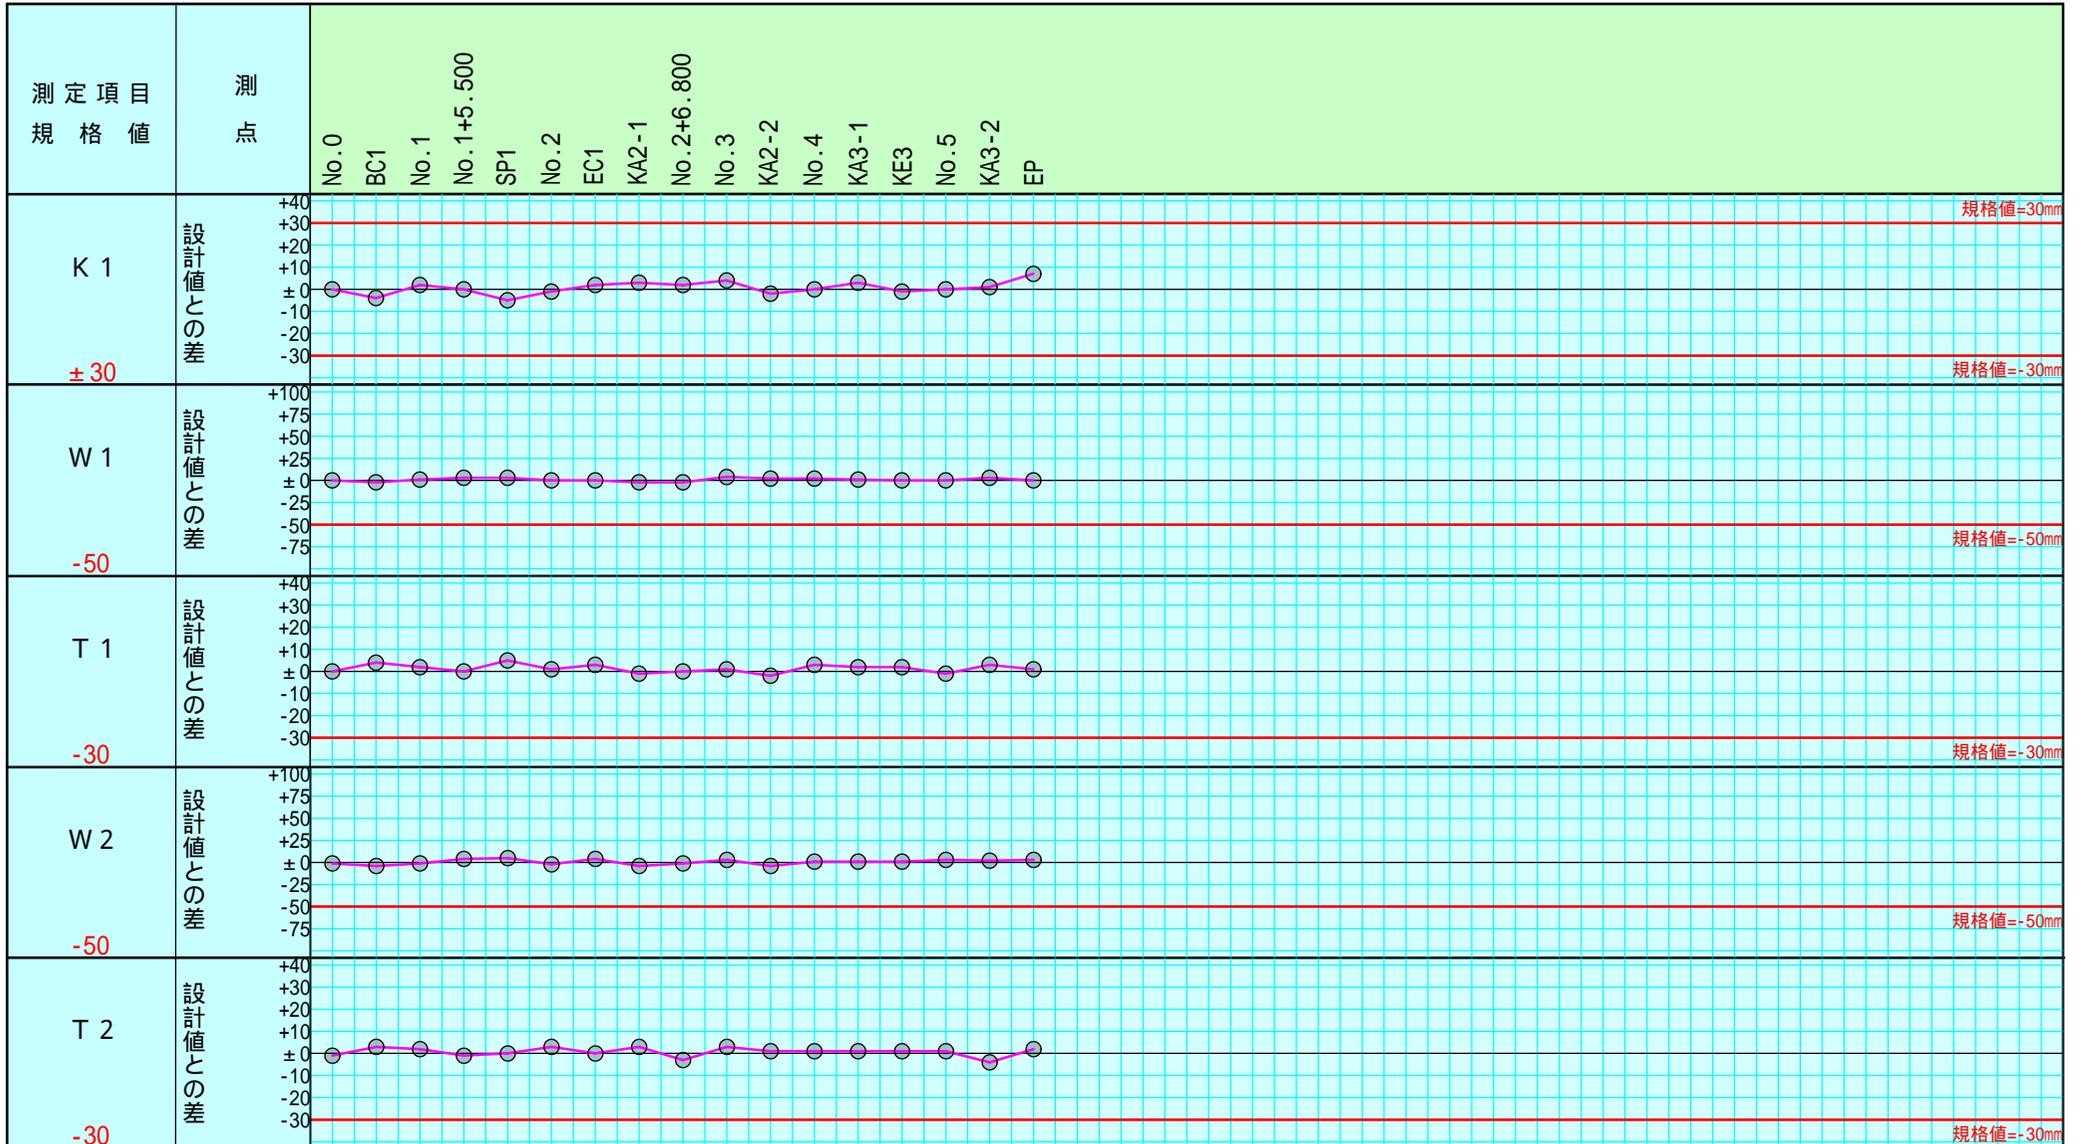

注) 不要な文字は = で消すこと。


出来形管理図 (工程能力図)

工 種 水路工

種 別 プレキャストU字側溝・自由勾配側溝工

測定者

印

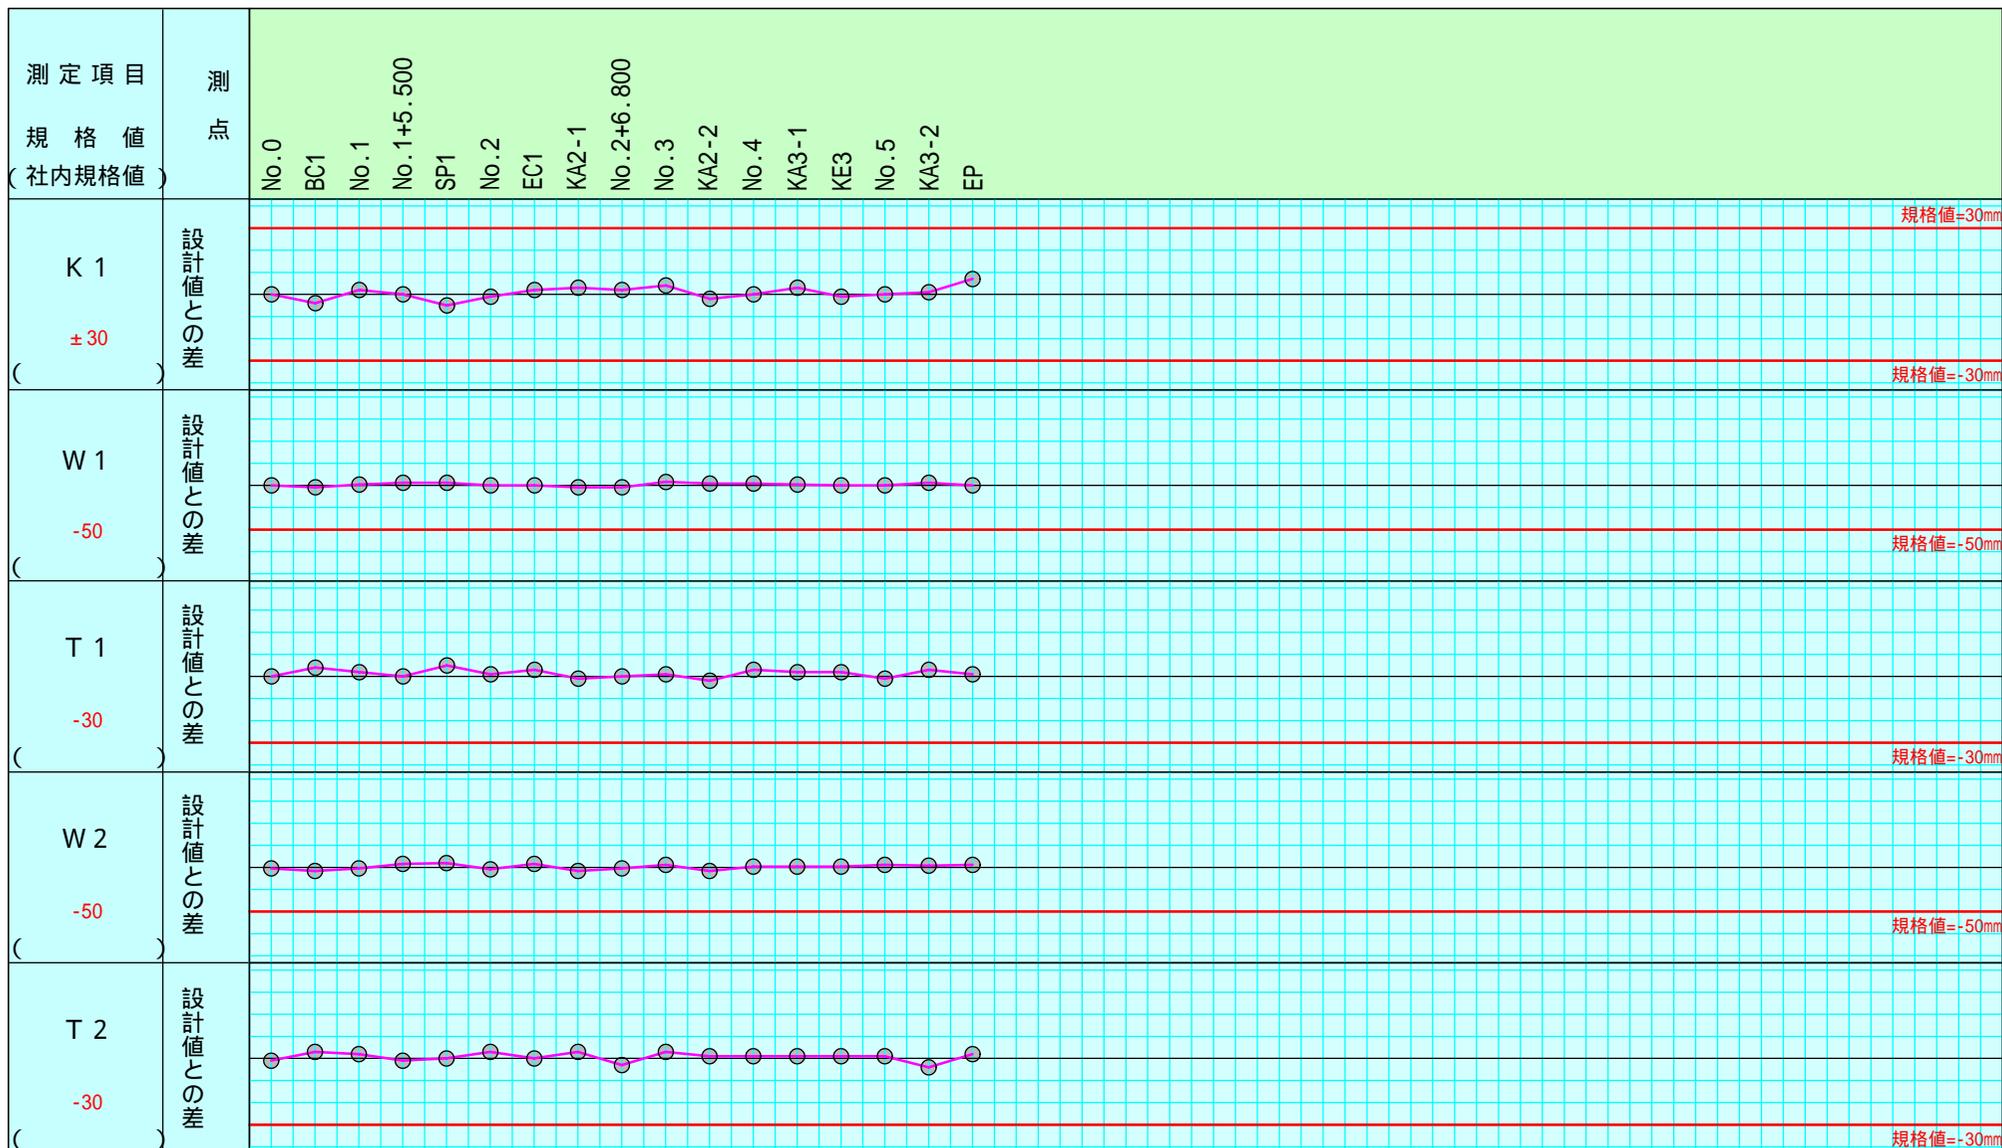


注) 不要な文字は = で消すこと。

プレキャストU字側溝・自由勾配側溝工度数表

測定者

印

W 1

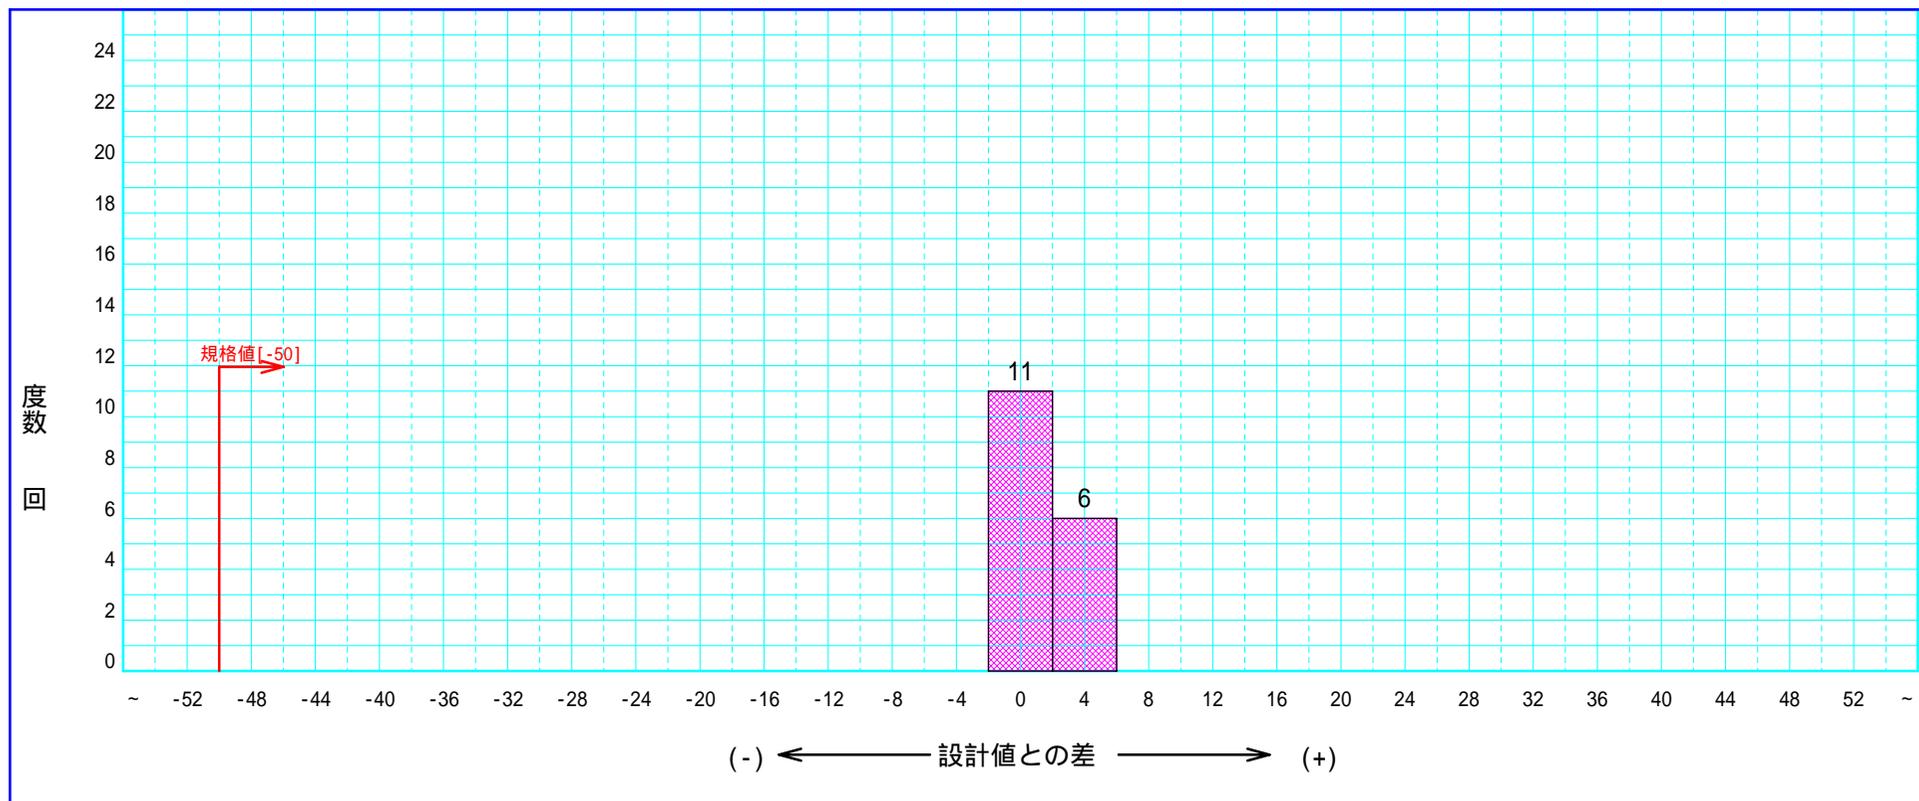


測定結果一覧表

様式 3 - 1

主任監督職員	監督職員	主任技術者

工事名 国道 × 舗装修繕工事
 工種名 プレキャストU字側溝・自由勾配側溝工

請負会社名 ウェストフィールド株式会社
 測定者 印



管理基準値 A		規格値 B		測定単位
+	-	+	-	
		+30	-30	m

K 1

管理基準値 A		規格値 B		測定単位
+	-	+	-	
			-50	mm

W 1

番号	月 日	測 点	設 計 値 C	実 測 値 D	設 計 値 との差 E = D - C	管 理 基 準 値との差 F = A - E
1		No.0	95.250	95.250	±0	
2		BC1	96.530	96.526	-4	
3		No.1	96.570	96.572	+2	
4		No.1+5.500	97.290	97.290	±0	
5		SP1	97.390	97.385	-5	
6		No.2	97.680	97.679	-1	
7		EC1	97.700	97.702	+2	
8		KA2-1	97.625	97.628	+3	
9		No.2+6.800	99.985	99.987	+2	
10		No.3	97.916	97.920	+4	
11		KA2-2	103.200	103.198	-2	
12		No.4	103.480	103.480	±0	
13		KA3-1	103.580	103.583	+3	
14		KE3	106.060	106.059	-1	

番号	月 日	測 点	設 計 値 C	実 測 値 D	設 計 値 との差 E = D - C	管 理 基 準 値との差 F = A - E
1		No.0	1,000	1,000	±0	
2		BC1	1,000	998	-2	
3		No.1	1,000	1,001	+1	
4		No.1+5.500	1,000	1,003	+3	
5		SP1	1,000	1,003	+3	
6		No.2	1,000	1,000	±0	
7		EC1	1,000	1,000	±0	
8		KA2-1	1,000	998	-2	
9		No.2+6.800	1,000	998	-2	
10		No.3	1,000	1,004	+4	
11		KA2-2	1,000	1,002	+2	
12		No.4	1,000	1,002	+2	
13		KA3-1	1,000	1,001	+1	
14		KE3	1,000	1,000	±0	

記入要項

- 「工種名」は、掘削（基準高(V)）、フルーム（厚さ(T)）、橋台工（中心線のズレ(e)）等と記入する。
- 「番号」の欄は施工順位を記入し、「測点」の欄は当該測定番号を記入する。

- 「月日」の欄は測定年月日を記入する。

W 1

出来形管理図表

主任監督職員	監督職員	主任技術者

工 事 名 国道 × 舗装修繕工事 請負会社名 ウェストフィールド 株式会社
 工 種 名 プレキャストU字側溝 測 定 者
 ・自由勾配側溝工

管理基準値 A		規格値 B		測 定 単 位
+	-	+	-	
			-50	mm


番号	月 日	測 点	設計値 C	実測値 D	設計値 との差 E = D - C	管理基準 値との差 F = A - E	設計値との差									
							-6	-4	-2	±	2	4	6			
1		No.0	1,000	1,000	±0											
2		BC1	1,000	998	-2											
3		No.1	1,000	1,001	+1											
4		No.1+5.500	1,000	1,003	+3											
5		SP1	1,000	1,003	+3											
6		No.2	1,000	1,000	±0											
7		EC1	1,000	1,000	±0											
8		KA2-1	1,000	998	-2											
9		No.2+6.800	1,000	998	-2											
10		No.3	1,000	1,004	+4											
11		KA2-2	1,000	1,002	+2											
12		No.4	1,000	1,002	+2											
13		KA3-1	1,000	1,001	+1											
14		KE3	1,000	1,000	±0											
15		No.5	1,000	1,000	±0											
16		KA3-2	1,000	1,003	+3											
17		EP	1,000	1,000	±0											

規格値 = -50 mm

記入事項


- 「工種名」は、掘削（基準高（V））、ル-b（厚さ（T））、橋台工（中心線のズレ（e））等と記入する。
- 「番号」の欄は施工順位を記入し、「測点」の欄は当該測点番号を記入する。
- 「月日」の欄は測定年月日を記入する。
- 設計値との差の単位を定め、目盛りに数値を記入する。

測定箇所図



様式(3)

出来形成果表

国道 × 舗装修繕工事 <hr/> 水路工 <hr/> 種 目 プレキャストU字側溝・自由 勾配側溝工 <hr/> 記 事 <hr/>		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">主任監督員</td> <td style="width: 33%;">監督員</td> <td style="width: 33%;">監督員</td> </tr> <tr> <td style="height: 40px;"></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	主任監督員	監督員	監督員				請 負 人 ウェストフィールド株式会社 <hr/> 現場代理人 日本 太郎 印 <hr/> 測 定 者 印
主任監督員	監督員	監督員							

測 点	K 1 (±30)			W 1 (-50)			T 1 (-30)			W 2 (-50)			T 2 (-30)		
	設 計	出来形	誤 差	設 計	出来形	誤 差	設 計	出来形	誤 差	設 計	出来形	誤 差	設 計	出来形	誤 差
No.0	95.250	95.250	±0	1,000	1,000	±0	200	200	±0	800	799	-1	100	99	-1
BC1	96.530	96.526	-4	1,000	998	-2	200	204	+4	800	796	-4	100	103	+3
No.1	96.570	96.572	+2	1,000	1,001	+1	200	202	+2	800	799	-1	100	102	+2
No.1+5.500	97.290	97.290	±0	1,000	1,003	+3	200	200	±0	800	804	+4	100	99	-1
SP1	97.390	97.385	-5	1,000	1,003	+3	200	205	+5	800	805	+5	100	100	±0
No.2	97.680	97.679	-1	1,000	1,000	±0	200	201	+1	800	798	-2	100	103	+3
EC1	97.700	97.702	+2	1,000	1,000	±0	200	203	+3	800	804	+4	100	100	±0
KA2-1	97.625	97.628	+3	1,000	998	-2	200	199	-1	800	796	-4	100	103	+3
No.2+6.800	99.985	99.987	+2	1,000	998	-2	200	200	±0	800	799	-1	100	97	-3
No.3	97.916	97.920	+4	1,000	1,004	+4	200	201	+1	800	803	+3	100	103	+3

()内数字は規格値

測定結果表

工 事 件 名 国道 × 舗装修繕工事	工 種	プレキャストU字側溝・自由勾配側溝工	現場代理人	日本 太郎
	測定頻度		測 定 者	

測 定 箇 所	測 定 月 日	設計値 (m)	実測値 (m)	偏差値 (mm)	規格値 (mm)	摘 要
K 1 No.0		95.250	95.250	±0	±30	
BC1		96.530	96.526	-4	±30	
No.1		96.570	96.572	+2	±30	
No.1+5.500		97.290	97.290	±0	±30	
SP1		97.390	97.385	-5	±30	
No.2		97.680	97.679	-1	±30	
EC1		97.700	97.702	+2	±30	
KA2-1		97.625	97.628	+3	±30	
No.2+6.800		99.985	99.987	+2	±30	
No.3		97.916	97.920	+4	±30	
KA2-2		103.200	103.198	-2	±30	
No.4		103.480	103.480	±0	±30	
KA3-1		103.580	103.583	+3	±30	
記 事						

アルバム添付用出来形略図

工事名： 国道 × 舗装修繕工事

工種	プレキャストU字側溝・自由勾配側溝工					測点	No.0	出来形検測
	K 1	W 1	T 1	W 2	T 2			
設計値	95.250	1,000	200	800	100			
実測値	95.250	1,000	200	799	99			
差	±0	±0	±0	-1	-1			

工種	プレキャストU字側溝・自由勾配側溝工					測点	SP1	出来形検測
	K 1	W 1	T 1	W 2	T 2			
設計値	97.390	1,000	200	800	100			
実測値	97.385	1,003	205	805	100			
差	-5	+3	+5	+5	±0			

工種	プレキャストU字側溝・自由勾配側溝工					測点	BC1	出来形検測
	K 1	W 1	T 1	W 2	T 2			
設計値	96.530	1,000	200	800	100			
実測値	96.526	998	204	796	103			
差	-4	-2	+4	-4	+3			

工種	プレキャストU字側溝・自由勾配側溝工					測点	No.2	出来形検測
	K 1	W 1	T 1	W 2	T 2			
設計値	97.680	1,000	200	800	100			
実測値	97.679	1,000	201	798	103			
差	-1	±0	+1	-2	+3			

工種	プレキャストU字側溝・自由勾配側溝工					測点	No.1	出来形検測
	K 1	W 1	T 1	W 2	T 2			
設計値	96.570	1,000	200	800	100			
実測値	96.572	1,001	202	799	102			
差	+2	+1	+2	-1	+2			

工種	プレキャストU字側溝・自由勾配側溝工					測点	EC1	出来形検測
	K 1	W 1	T 1	W 2	T 2			
設計値	97.700	1,000	200	800	100			
実測値	97.702	1,000	203	804	100			
差	+2	±0	+3	+4	±0			

工種	プレキャストU字側溝・自由勾配側溝工					測点	No.1+5.500	出来形検測
	K 1	W 1	T 1	W 2	T 2			
設計値	97.290	1,000	200	800	100			
実測値	97.290	1,003	200	804	99			
差	±0	+3	±0	+4	-1			

工種	プレキャストU字側溝・自由勾配側溝工					測点	KA2-1	出来形検測
	K 1	W 1	T 1	W 2	T 2			
設計値	97.625	1,000	200	800	100			
実測値	97.628	998	199	796	103			
差	+3	-2	-1	-4	+3			
