

アスファルトの切取供試体試験 管理表

試験報告用紙


工事名 国道〇〇号線情報ボックス敷設工事

工種 表層工

試験年月日 07年 11月 05日

混合物種類 密粒度ASC(13)

試験者 日本 太郎

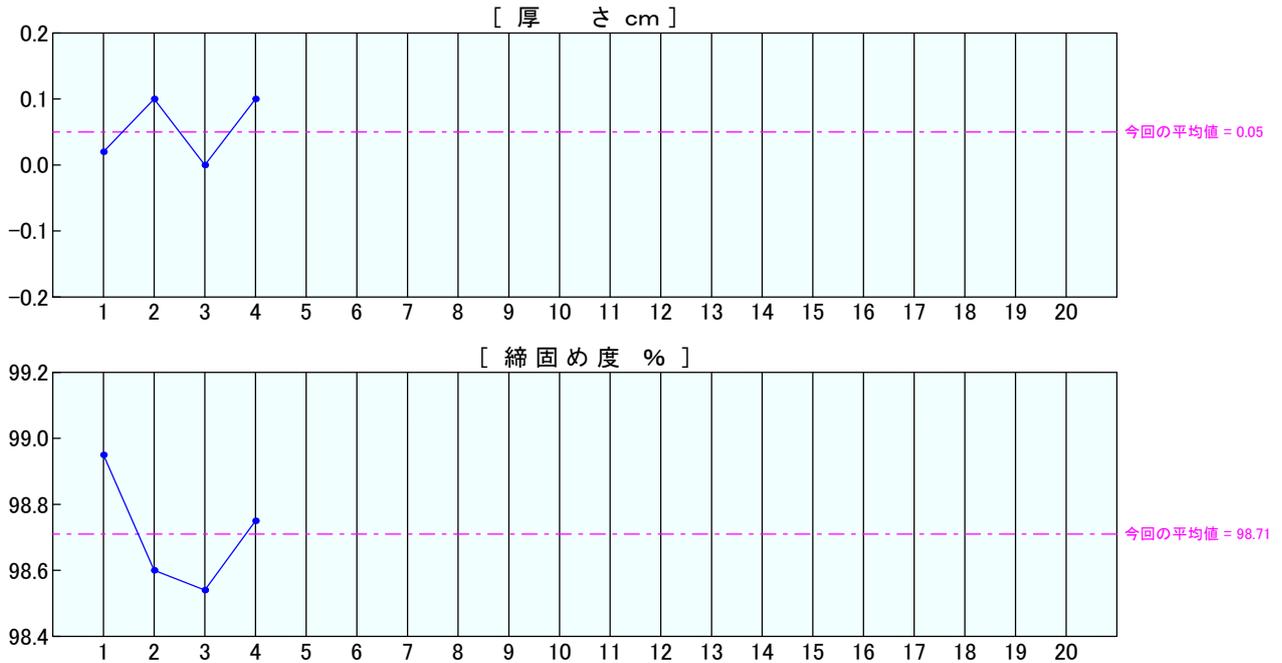

No.	測 点 名		厚 さ				密 度			
			厚さ1	厚さ2	厚さ3	厚さ4	平均値	差	実測値	締固度
1	NO.29	左	5.02				5.02	0.02	2.324	98.95
2	NO.31	左	5.10				5.10	0.10	2.316	98.60
3	NO.33+2.000	中	5.00				5.00	0.00	2.315	98.54
4	NO.42	右	5.10				5.10	0.10	2.320	98.75
平均値							5.06	0.05	2.319	98.71
